



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

 UFOP	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DESCRIÇÃO DA OBRA	TERMO DE CONTRATO	TERMO DE LICITAÇÃO	DATA ASSINATURA	PRAZO DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITIVOS
	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DA VALE/MINERAÇÃO - ITV	Nº31/2015	CONC. 001/2015	07/12/2015	480 dias	30/03/2017	TERMO -
CONTRATANTE	CONTRATADA	VALOR ESTIMADO	VALOR DO CONTRATO	DESCONTO FORNECIDO		-	-
 FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO OURO PRETO	AGD CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.370.333,50	R\$ 3.782.314,52	R\$ 588.018,98 ou 13%		-	-
						-	-


ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO MENSAL DE SERVIÇOS										
CRONOGRAMA FINANCEIRO	CRONOGRAMA ACUMULADO	MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% PAGO ACUMULADA	% TEMPO	VALOR PAGO ACUMULADO	PAGO MENOS ACUMULADO	% SALDO	SALDO
R\$ 15.085,69	R\$ 15.085,69	1ª	08/01/2016	R\$ 22.965,28	0,61	6,67	R\$ 22.965,28	R\$ 7.879,59	99,39	R\$ 3.759.349,24
R\$ 40.689,03	R\$ 55.774,72	2ª	08/02/2016	R\$ 17.708,67	1,08	13,13	R\$ 40.673,95	-R\$ 15.100,77	98,92	R\$ 3.741.640,57
R\$ 114.138,35	R\$ 169.913,07	3ª	08/03/2016	R\$ 73.485,12	3,02	19,17	R\$ 114.159,07	-R\$ 55.754,00	96,98	R\$ 3.668.155,45
R\$ 86.887,76	R\$ 256.800,83	4ª	08/04/2016	R\$ 253.102,35	9,71	25,63	R\$ 367.261,42	R\$ 110.460,59	90,29	R\$ 3.415.053,10
R\$ 148.168,63	R\$ 404.969,46	5ª	08/05/2016	R\$ 277.323,08	17,04	31,88	R\$ 644.584,50	R\$ 239.615,04	82,96	R\$ 3.137.730,00
R\$ 150.644,03	R\$ 555.613,49	6ª	08/06/2016	R\$ 261.348,80	23,95	38,33	R\$ 905.933,30	R\$ 350.319,81	76,05	R\$ 2.876.381,20
R\$ 251.135,67	R\$ 806.749,16	7ª	08/07/2016	R\$ 274.026,56	31,20	44,58	R\$ 1.179.959,86	R\$ 373.210,70	68,80	R\$ 2.602.354,66
R\$ 287.042,31	R\$ 1.093.791,47	8ª	08/08/2016	R\$ 204.178,00	36,59	51,04	R\$ 1.384.137,86	R\$ 290.346,39	63,41	R\$ 2.398.176,66
R\$ 296.199,12	R\$ 1.389.990,59	9ª	08/09/2016	R\$ 285.596,19	44,15	57,50	R\$ 1.669.734,05	R\$ 279.743,46	55,85	R\$ 2.112.580,47
R\$ 457.156,78	R\$ 1.847.147,37	10ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 325.377,86	R\$ 2.172.525,23	11ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 347.964,04	R\$ 2.520.489,27	12ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 394.482,80	R\$ 2.914.972,07	13ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 522.898,43	R\$ 3.437.870,50	14ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 295.516,93	R\$ 3.733.387,43	15ª	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$ 48.927,09	R\$ 3.782.314,52	16ª	-	-	-	-	-	-	-	-

FISCALIZAÇÃO - UFOP

V I S T O	_____ ENGº WILLER GISCHEWSKI FISCAL DE OBRAS	_____ ENGº LUIZ CARLOS PIVA CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
----------------------------------	--	--


UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DA OBRA	TERMO DE CONTRATO	TERMO DE LICITAÇÃO	DATA ASSINATURA	PRAZO DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITIVOS	
						TERMO	VIGÊNCIA
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DA VALE/MINERAÇÃO - ITV	Nº31/2015	CONC. 001/2015	07/12/2015	480 dias	30/03/2017	-	-
CONTRATANTE	CONTRATADA	VALOR ESTIMADO	VALOR DO CONTRATO	DESCONTO FORNECIDO		-	-
 FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO OURO PRETO	AGD CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.370.333,50	R\$ 3.782.314,52	R\$ 588.018,98 ou 13%		-	-



**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO - Nº31**

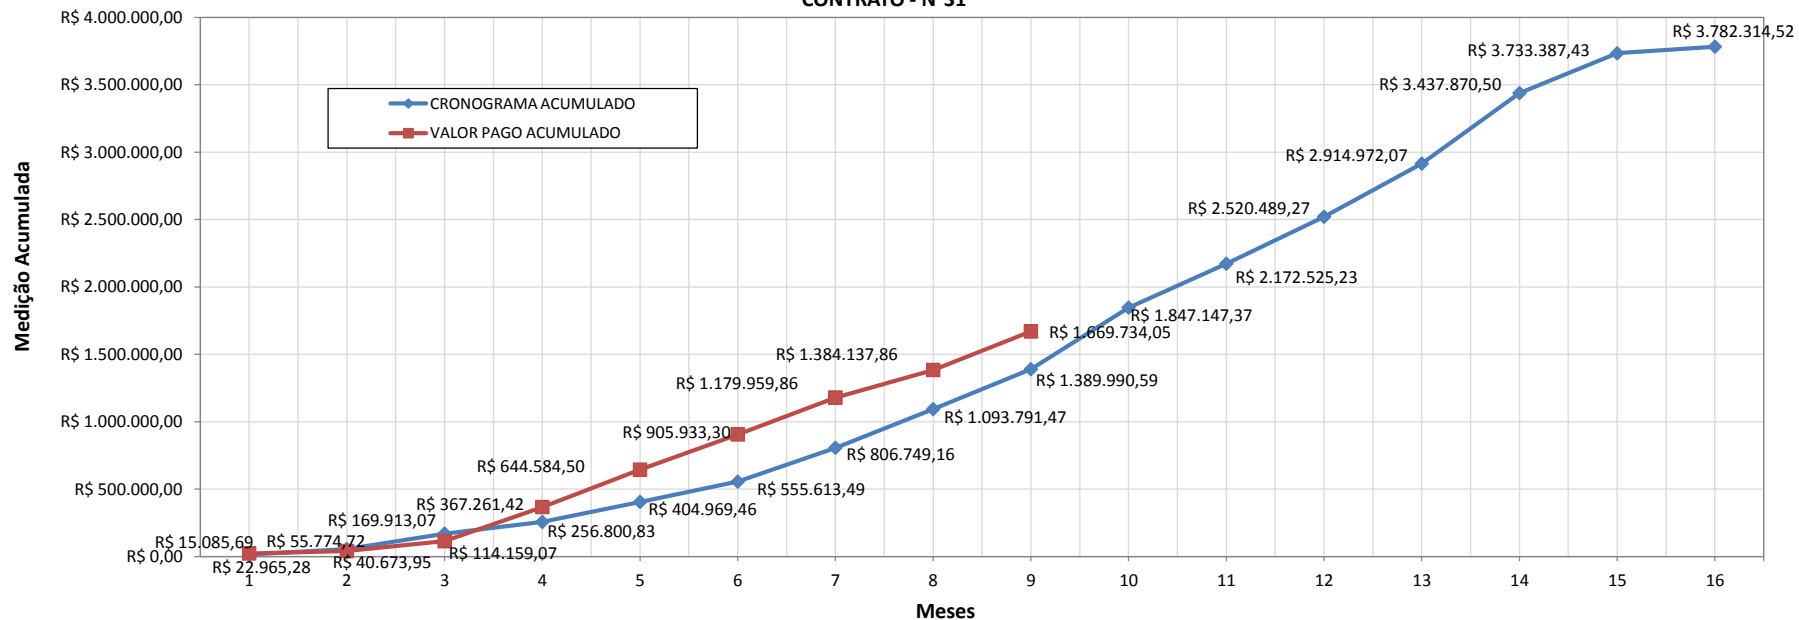

FISCALIZAÇÃO - UFOP

V
I
S
T
O

ENGº WILLER GISCHEWSKI
FISCAL DE OBRAS

ENGº LUIZ CARLOS PIVA
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
